




PANDEMIC

Projeto de Gerência e Manutenção de software
Parte 3

Equipe



Geiziane Silva Gonçalves
Ítalo Ferreira da Silva,
Oliver Pereira de Almeida,
Patricia Carvalho de Moraes
Rafael Roza de Abreu Soares e
Fernando René Cabral Araújo Filho



 <https://github.com/Rarkunho/pandemic-uff-gpms-ps.git>  





MONITORAMENTO

Labels

Milestones

Edit

Close Milestone

New issue

3° entrega do trabalho

Open

Due by July 1, 2025

Last updated now

0% complete

"A terceira apresentação deve apresentar a versão final do produto (demo), as dificuldades e decisões tomadas ao longo do desenvolvimento, o histórico de versões no controle de versões, além de todos os dados de monitoramento e controle do projeto (conforme descrito anteriormente). Se o grupo não tiver apresentado Pull Requests e integração contínua na segunda apresentação, pode-se apresentar nesta apresentação para o bônus. Caso o grupo deseje que o professor pondere a nota por membro do grupo, deve ser informada nesta apresentação a participação de cada membro do grupo no trabalho (PV e EV de cada membro)."

Show less ^

☐ Open 0

Closed 0

There are no open issues in this milestone

Add issues to milestones to help organize your work for a particular release or project. Find and add [issues with no milestones](#) in this repo.





HISTÓRICO DE VERSÕES

Graph	Description	Date	Author
	main feat: classes de cartas e gitignore	1 Jul 2025 11:47	Italo
	Merge branch 'dev-main'	1 Jul 2025 11:46	Italo
	Merge branch 'create-commands'	1 Jul 2025 11:46	Italo
	Merge branch 'dev-game'	1 Jul 2025 11:46	Italo
	Merge branch 'dev-board'	1 Jul 2025 11:45	Italo
	Merge branch 'create-disease'	1 Jul 2025 11:45	Italo
	Merge branch 'create-city'	1 Jul 2025 11:45	Italo
	Merge branch 'dev-player'	1 Jul 2025 11:45	Italo
	stash@{0} On dev-game: !!GitHub_Desktop<dev-game>	1 Jul 2025 11:39	Italo
	dev-game feat: condições de término e melhorias no funcionamento do jogo	30 Jun 2025 20:35	Italo
	dev-main fix: compatibilidade	30 Jun 2025 20:34	Italo
	dev-board feat: overhaul na UI e funcionamento do board	30 Jun 2025 20:33	Italo
	create-city feat: funcionamento correto dos centros e surtos	30 Jun 2025 20:32	Italo
	create-disease fix: alteração menor	30 Jun 2025 20:30	Italo
	create-commands Feat: Comandos Finalizados e build center correto	30 Jun 2025 20:29	Italo
	dev-player Feat: comandos adicionais e mensagens no jogo	30 Jun 2025 20:29	Italo
	Organizando repositório	3 Jun 2025 16:42	ItzOliver
	fix: correção da primeira apresentação	3 Jun 2025 15:44	RafaelRozaa
	Delete 1º Apresentação do Trabalho GPMS.pptx	3 Jun 2025 15:10	geiziane-sg
	Adiciona a Primeira Apresentação de GPMS em PDF	3 Jun 2025 15:01	geiziane-sg
	Delete Apresentacao 2 Pandemic.pptx	3 Jun 2025 14:51	Patricia Carvalho
	Add files via upload	3 Jun 2025 14:47	Patricia Carvalho
	Add files via upload	3 Jun 2025 14:44	Patricia Carvalho
	Adiciona a Primeira Apresentação de GPMS	3 Jun 2025 14:34	geiziane-sg
	Merge branch 'main' into dev-main	2 Jun 2025 22:57	Italo





DECISÕES

- Mudança do requisito funcional: "O sistema deve permitir iniciar um jogo com 2 a 4 instâncias de Player". Foi fixada a quantidade de 4 jogadores.
 - Motivo: redução do escopo.
- Mudança do requisito funcional: "O sistema deve permitir ao Player invocar o método de movimento descartando a CityPlayerCard correspondente da sua hand". Não é necessário descartar a CityPlayerCard para o player se mover. 
 - Motivo: o comando de move é um comando padrão do jogo para todos os jogadores, não há necessidade de complicar o movimento
- Mudança do requisito funcional: "O sistema deve permitir ao Player invocar o método Player.buildCenter() na City atual, descartando a CityPlayerCard correspondente e definindo City.hasCenter = true." Não é necessário descartar a CityPlayerCard após essa invocação.
 - Motivo: Construir centros não consome cartas nessa versão do jogo pois as cartas foram simplificadas apenas para tratar doenças e curar surtos



DIFICULDADES - DESENVOLVIMENTO

- Encaixar a arquitetura do jogo conforme as arquiteturas demandadas pela atividade/trabalho da disciplina. O jogo foi desenvolvido e então tivemos que verificar ele para saber se conseguíamos encaixar com os padrões apresentados em aula;
- Usar branches em um cenário onde o projeto não necessitou de muitas atividades e desenvolvimentos paralelos. As branches de desenvolvimento foram na maior parte usadas pra tentar usar as branches de alguma forma, mas como não havia múltiplos desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo as alterações foram feitas periodicamente com bastante comunicação





DIFICULDADES - GERENCIAMENTO

- Encontrar ferramentas pro planejamento que funcionassem de forma compartilhada,
- Medir esforço das atividades
- Tomar nota do momento exato em que as atividades se encerraram
- Retrabalho no eva e burndown, devido a equívocos no intervalo de tempo e disposição das variáveis
- Gerenciamento do tempo






GANTT

	🕒	Nome	Duração	Início	Fim	Nomes dos Recursos	Sucessores
1	✅	Pandemic	63 dias?	04/04/2025 08:00	02/07/2025 08:00		
2	✅	Produto	41,125 dias?	02/05/2025 08:00	30/06/2025 09:00		
3	📅✅	Análise e Design	11 dias	02/05/2025 08:00	16/05/2025 17:00	Fernando;Italo	4
4	📅✅	Mecânica de Jogo (Part...	7 dias?	19/05/2025 08:00	27/05/2025 17:00	Fernando;Italo	34;7;8;9;10
5	📅✅	Interface (Parte 1)	2 dias?	06/05/2025 08:00	07/05/2025 17:00	Fernando;Italo;Oliver	
6	📅✅	Testes (Parte 1)	4 dias?	12/05/2025 08:00	15/05/2025 17:00	Fernando;Italo;Oliver	
7	📅✅	Controle de Jogadores (...)	7 dias?	28/05/2025 08:00	05/06/2025 17:00	Fernando;Italo	34;8;11
8	📅✅	Sistemas de Ações de Jo...	4,25 dias?	06/06/2025 08:00	12/06/2025 10:00	Fernando;Italo	34;14
9	📅✅	Sistemas e Doenças (Part...	6 dias?	28/05/2025 08:00	04/06/2025 17:00	Fernando;Italo	34;15
10	📅✅	Mecânica de Jogo (Parte 2)	7 dias?	28/05/2025 08:00	05/06/2025 17:00	Fernando;Patricia	33;11;15
11	📅✅	Controle de Jogadores (...)	5 dias?	06/06/2025 08:00	12/06/2025 17:00	Fernando;Oliver	33;14
12	📅✅	Interface (Parte 2)	2 dias?	04/06/2025 08:00	05/06/2025 17:00	Fernando;Geiziane	
13	📅✅	Testes (Parte 2)	3 dias?	04/06/2025 08:00	06/06/2025 17:00	Italo;Patricia	
14	📅✅	Sistemas de Ações de Jo...	5,375 dias?	13/06/2025 08:00	20/06/2025 11:00	Fernando;Oliver	33
15	📅✅	Sistemas e Doenças (Part...	7 dias?	19/06/2025 09:00	30/06/2025 09:00	Fernando;Patricia	33
16	📅✅	Gerenciamento de projeto	3 dias?	02/05/2025 08:00	06/05/2025 17:00		
17	📅✅	Estratégia de Ramificação	1 dia	02/05/2025 08:00	02/05/2025 17:00	Fernando;Italo;Oliver	4
18	📅✅	Controle de Versões	2 dias?	02/05/2025 08:00	05/05/2025 17:00	Todos	4
19	📅✅	Cronograma (Gantt)	0,5 dias	05/05/2025 12:00	05/05/2025 17:00	Rafael	25
20	📅✅	Custo e Orçamento	1 dia	06/05/2025 08:00	06/05/2025 17:00	Geiziane;Oliver	
21	📅✅	Planning Poker	2 dias?	02/05/2025 08:00	05/05/2025 17:00	Todos	20
22	📅✅	EAP	0,5 dias?	05/05/2025 08:00	05/05/2025 13:00	Geiziane;Rafael	19;35
23	📅✅	Escopo	1 dia	02/05/2025 08:00	02/05/2025 17:00	Geiziane;Patricia;Rafael	22
24	✅	Monitoramento e controle	61,667 dias?	04/04/2025 08:00	30/06/2025 14:20		
25	📅✅	EVA (Parte 1)	2 dias?	06/05/2025 08:00	07/05/2025 17:00	Rafael;Geiziane;Patricia	26;27;35
26	📅✅	Burndown (Parte 1)	3 dias?	06/05/2025 08:00	08/05/2025 17:00	Rafael;Geiziane	35;28
27	📅✅	EVA (Parte 2)	2 dias?	02/06/2025 08:00	03/06/2025 17:00	Geiziane;Rafael	34;29
28	📅✅	Burndown (Parte 2)	2 dias?	02/06/2025 08:00	03/06/2025 17:00	Patricia;Rafael	34;30
29	📅✅	EVA (Parte 3)	0,667 dias	30/06/2025 08:00	30/06/2025 14:20	Geiziane;Patricia;Rafael	33
30	📅✅	Burndown (Parte 3)	0,667 dias	30/06/2025 08:00	30/06/2025 14:20	Patricia;Geiziane;Rafael	33
31	📅✅	Riscos	2 dias	04/04/2025 08:00	07/04/2025 17:00	Geiziane;Italo;Patricia;Rafael	35
32	📅✅	Apresentações e Demos	41 dias	06/05/2025 08:00	02/07/2025 08:00		
33	📅✅	Apresentação Final	0 dias	02/07/2025 08:00	02/07/2025 08:00	Todos	
34	📅✅	Apresentação Intermedia...	0 dias	04/06/2025 08:00	04/06/2025 08:00	Todos	
35	📅✅	Apresentação Inicial	0,748 dias	06/05/2025 08:00	07/05/2025 08:59	Todos	
Pandemic- Página1							





GANNT GRÁFICO

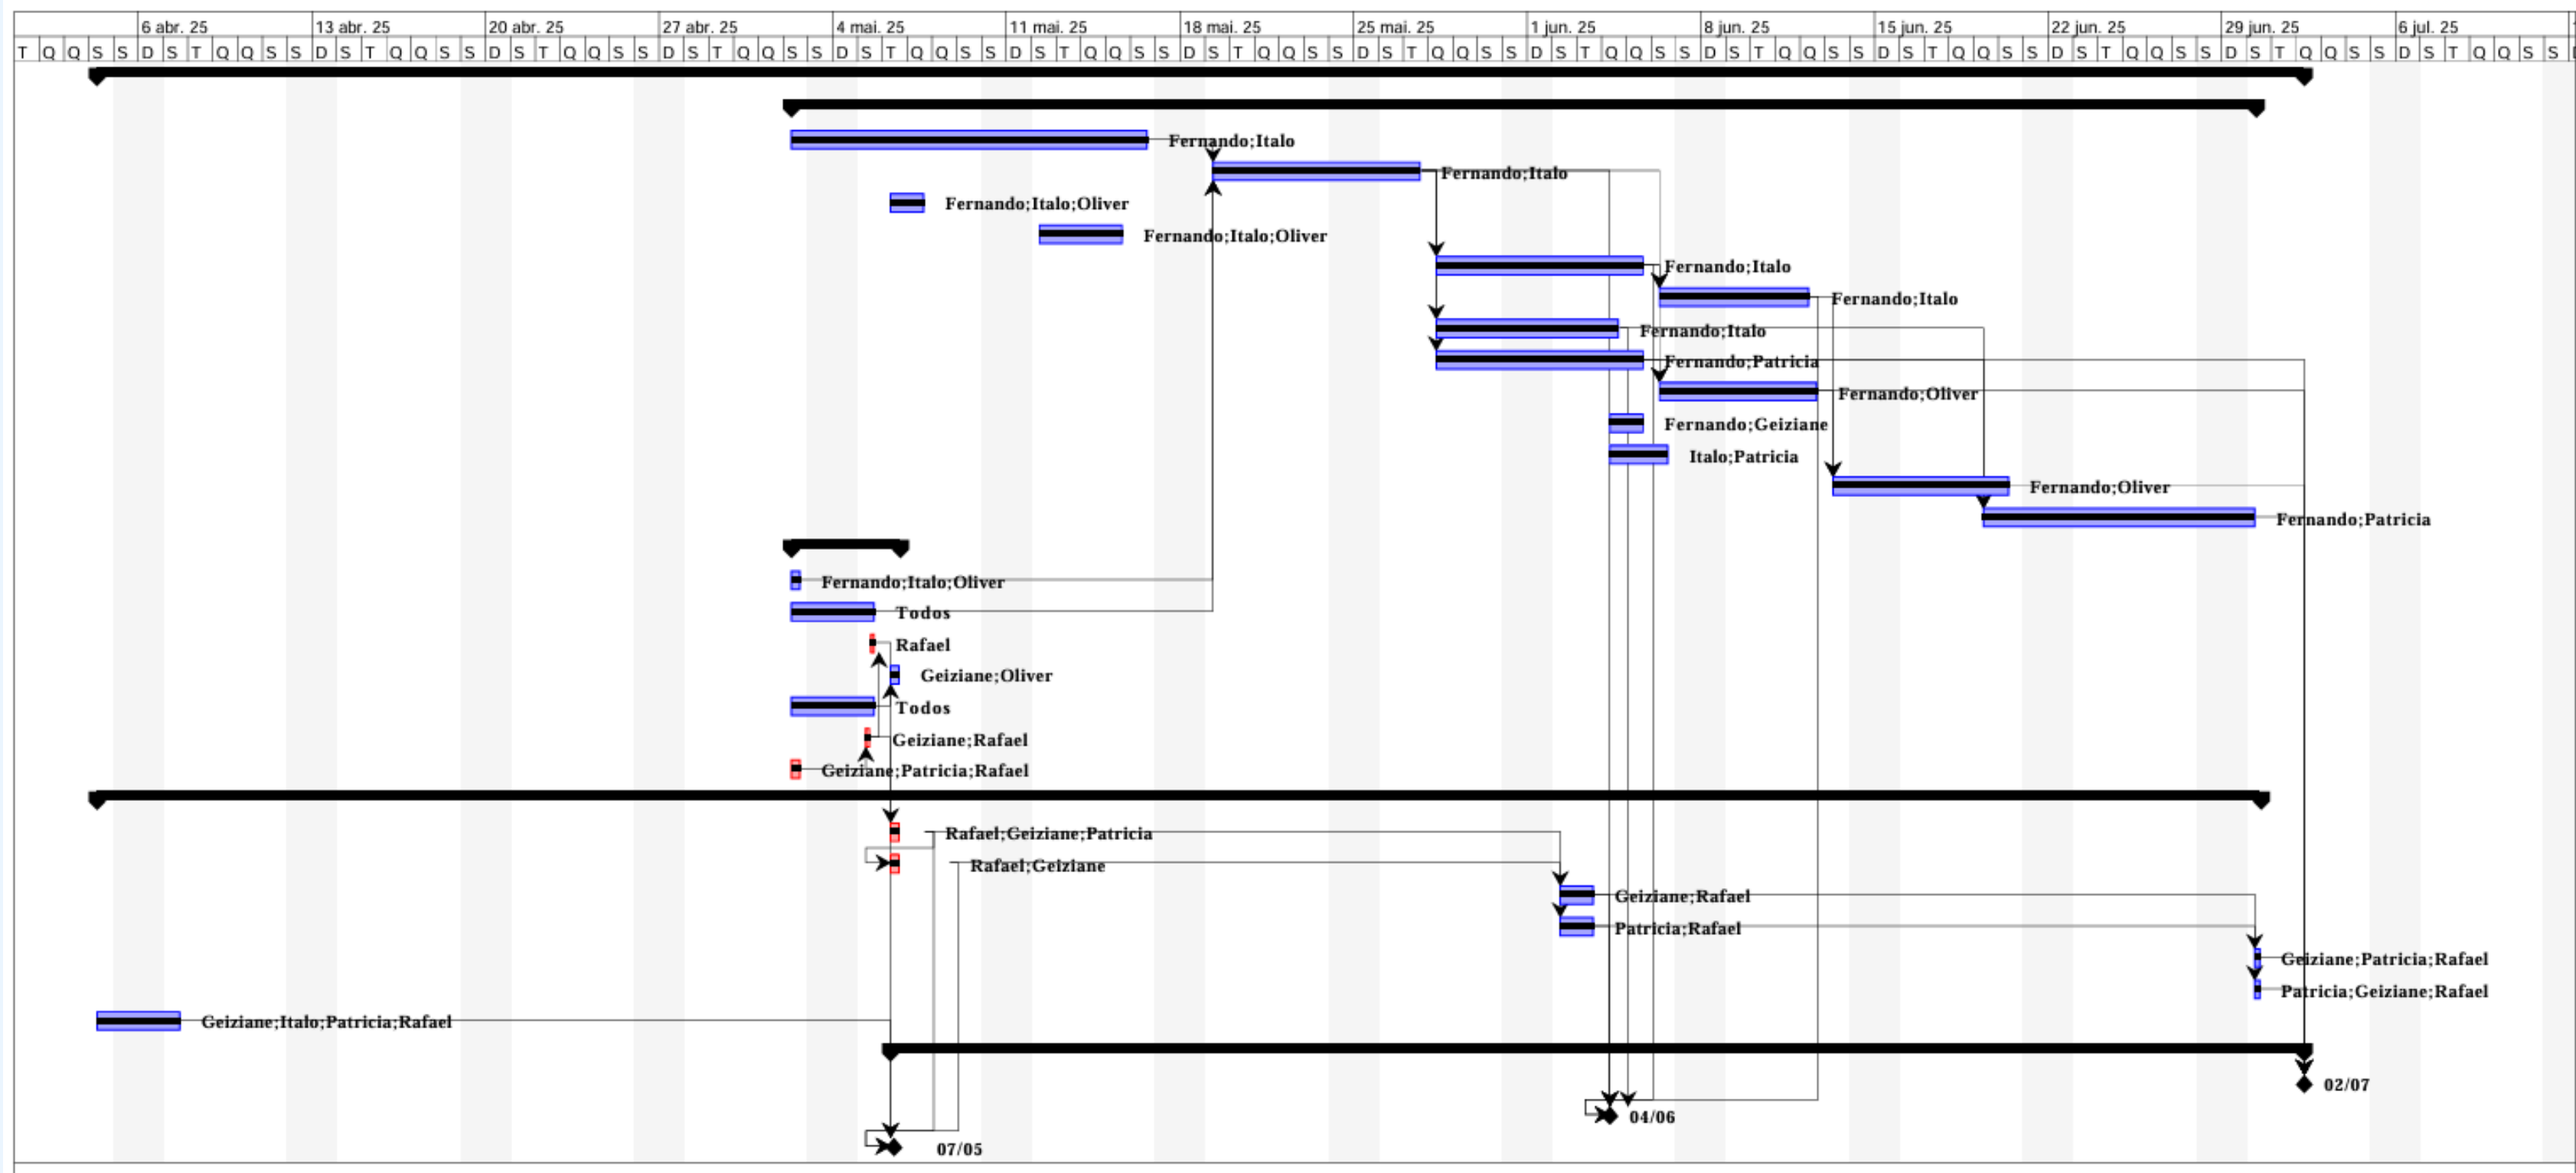




EVA

SPI	CPI	%conclusão(real)
1,324645161	1,249665247	0,3806451613
1,117762702	1,19467298	0,7483870968
1,122580645	1,338461538	1


Analise de Valor Agregado (EVA)

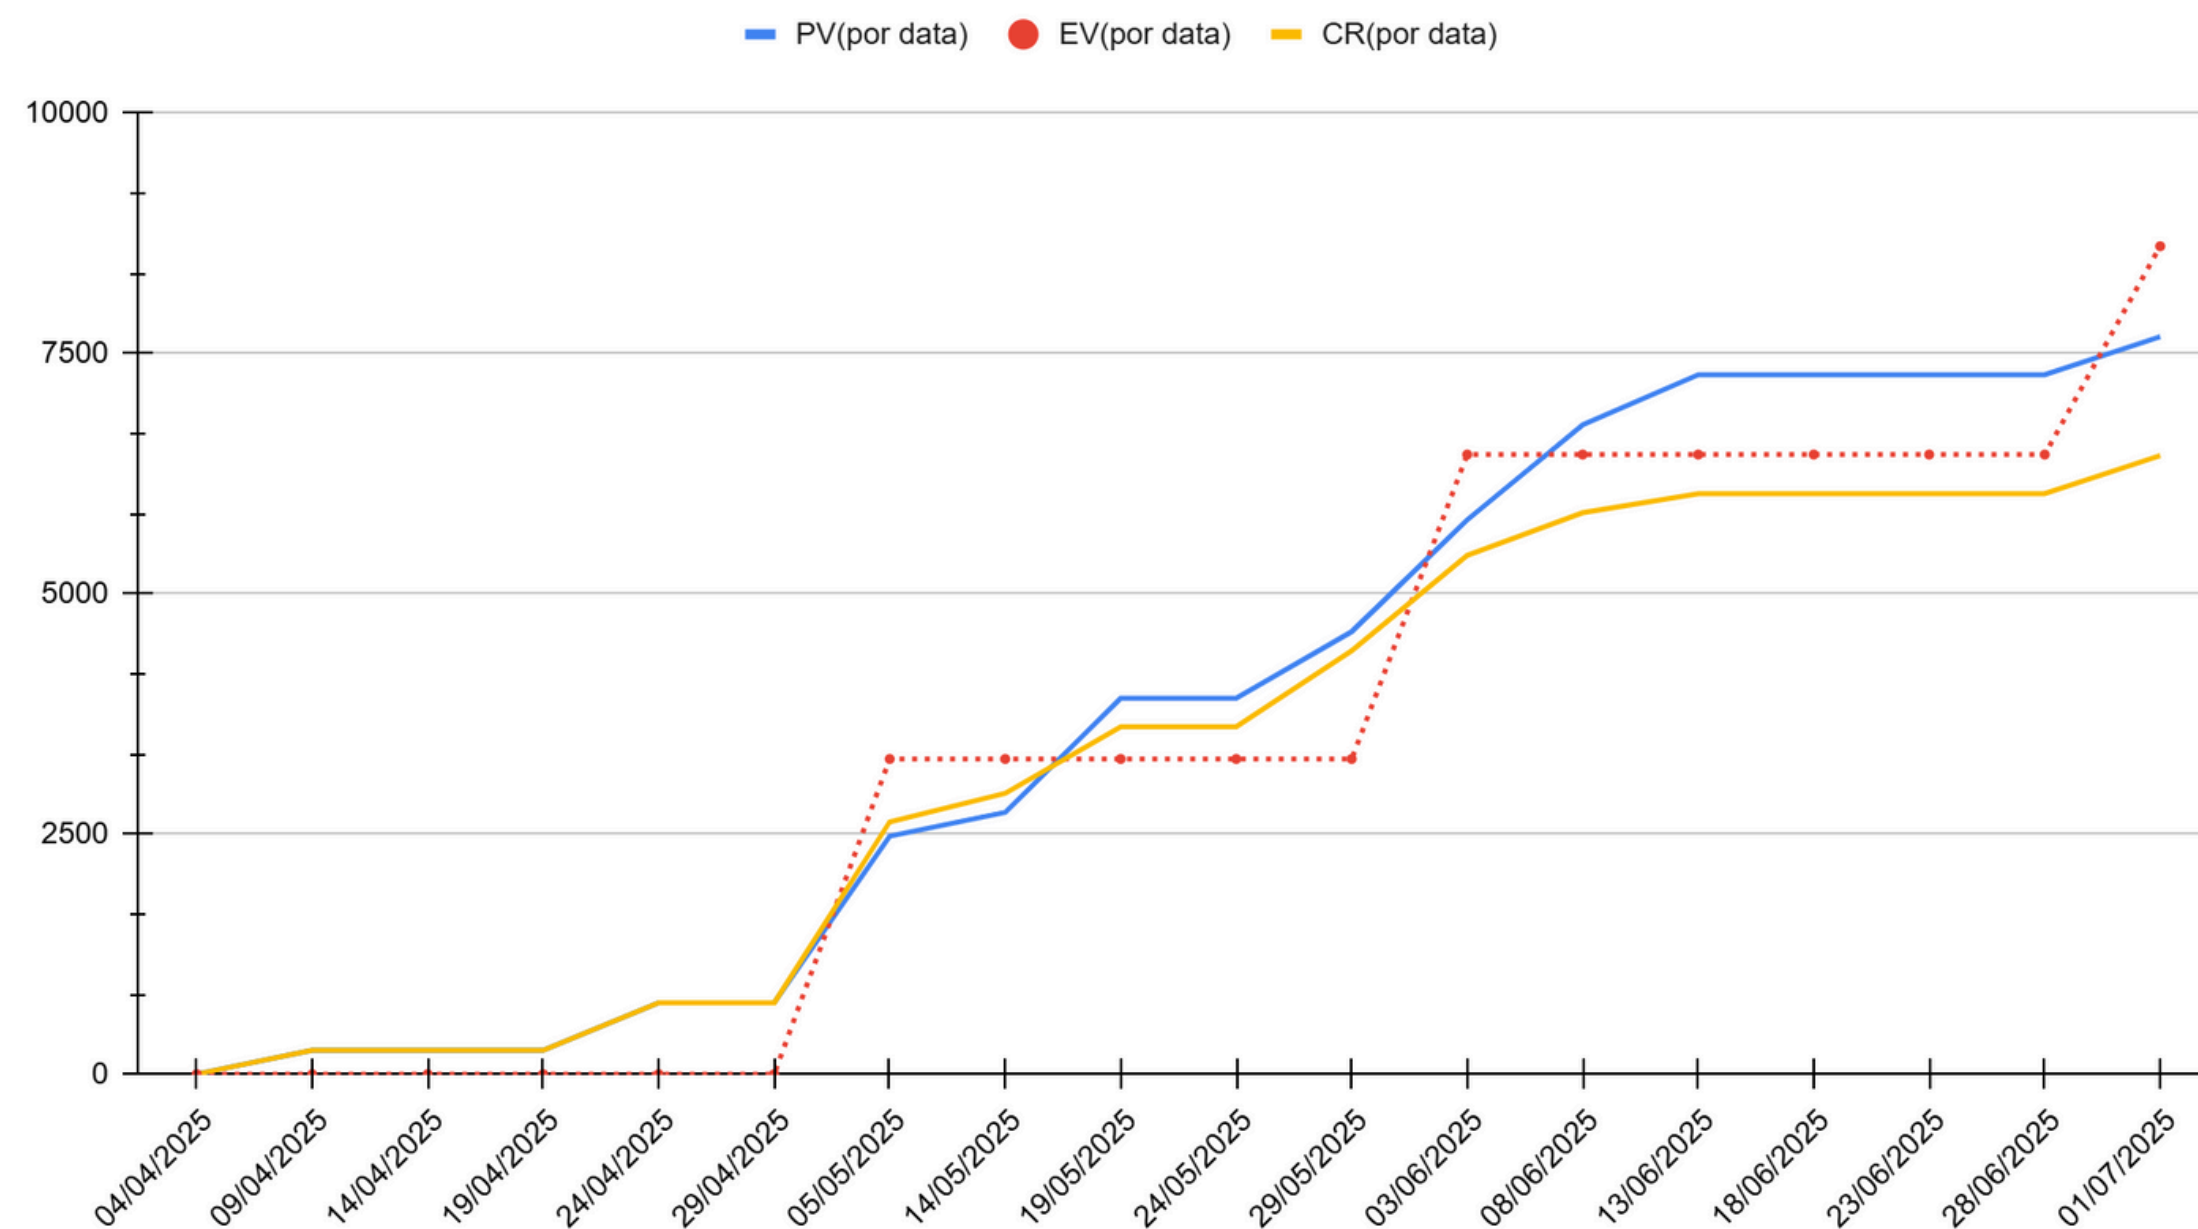



BURNDOWN

Burndown (Parte 3)

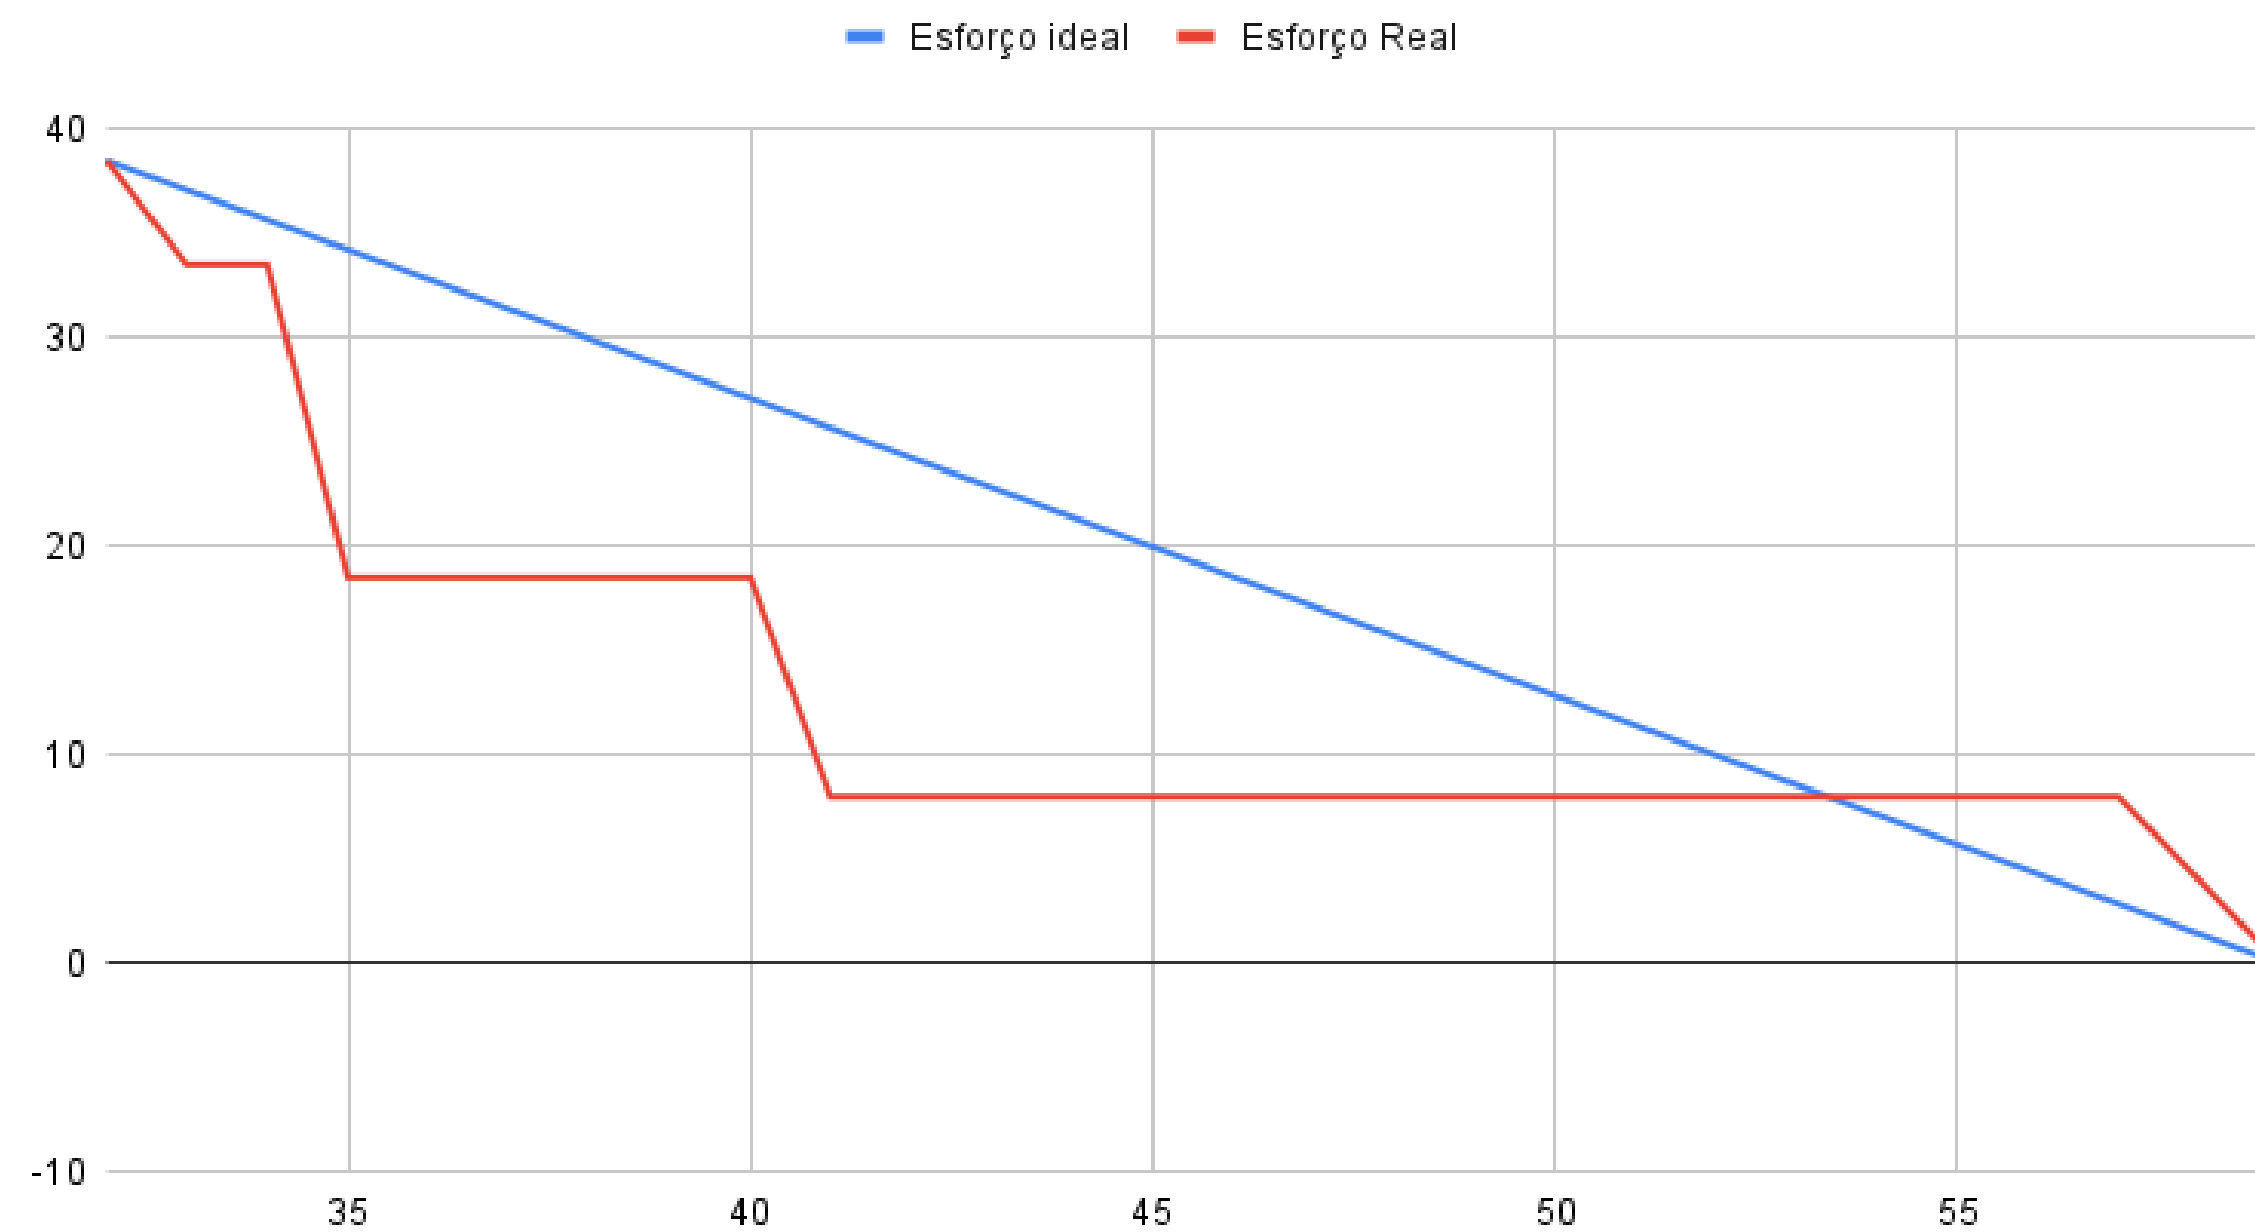

The background is a deep blue with abstract, flowing, wavy lines in shades of teal and light blue. In the center, there is a faint, semi-transparent image of a person wearing a VR headset, with the text 'VRQUEST' and 'VR' visible. Below this, a car is also faintly visible. The overall aesthetic is futuristic and tech-oriented.

OBRIGADO!
